

長

柄

ダ

ム

通

信



令和6年1月
第1号長柄ダム
再開発事務所

こんにちは、長柄ダム再開発事務所です。

皆様方には、昨年2月から順次、用地のご協力をいただいております、お蔭様をもちまして、昨年7月に第1号の工事を発注することができました。

現在は、付替道路を施工するために必要な「待避所の設置」や「樹木の伐採」などの準備的な工事を行っています。今後、付替道路工事が本格化してまいりますので、随時、現場の状況をお知らせする予定です。

事業進捗状況

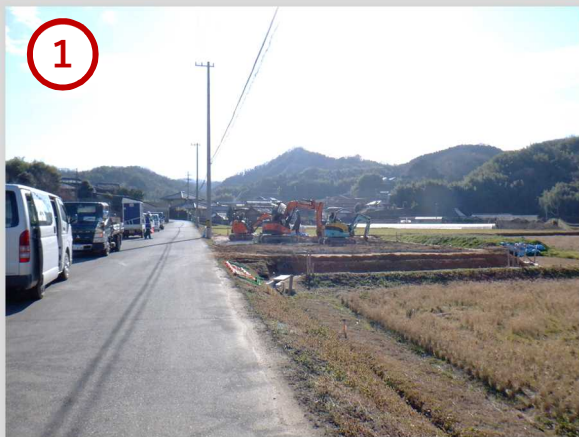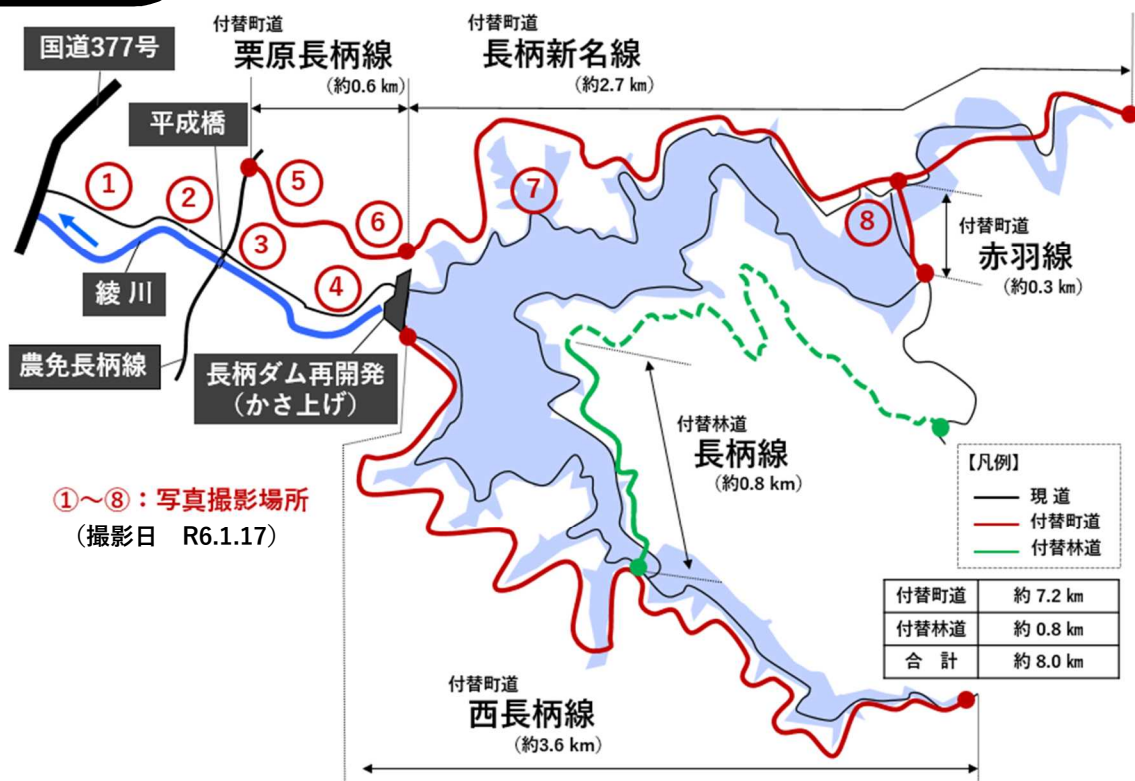

工事用車両と一般車両とのすれ違いがスムーズにできるよう、待避所をつくっています。①の箇所は田んぼをお借りして広いスペースを確保していますが、②の箇所は山と川に挟まれて余裕がないため、用水路を排水管用で埋めさせていただき、約1.5m幅のスペースを確保しました。 工期：R5.7.11～R6.2.29 受注者：河田土建(有)



平成橋の東側交差点を、車両のすれ違いがスムーズにできるよう、一部隅切りも行っています。
工期：R5.7.11～R6.2.29 受注者：河田土建(有)



工事用車両と一般車両とのすれ違いがスムーズにできるよう、待避所をつくりました。【完了】
工期：R5.10.3～R6.1.10 受注者：(有)仁科興業



付替道路工事を施工するために必要な、進入路の設置や樹木の伐採を行っています。
工期：R5.7.11～R6.2.29 受注者：河田土建(有)



付替道路工事を施工するために必要な、進入路の設置や樹木の伐採を行っています。
工期：R5.8.23～R6.2.29 受注者：桑島開発(株)



既設の橋に重量規制（14t まで）があり、工事用車両が通行できないため、代わりの工事用道路を貯水池内につくっています。
工期：R5.9.12～R6.2.15 受注者：綾上建設(株)



⑦工事に伴い、ダム貯水池の貯水容量を確保するため、堆積していた土砂を撤去しました。【完了】
工期：R5.9.5～R5.12.15 受注者：(有)細谷建設工業

問合せ先

香川県 中讃土木事務所 長柄ダム再開発事務所

〒761-2292 香川県綾歌郡綾川町山田下 2224 番地（綾川町綾上支所 2 階）

TEL 087-899-7737
